

เกษียณหนังสือรับ

☐ กองคลัง ☒ กองช่าง ☐ กองการฝึกฝน

☐ กองสาธารณสุข ☐ หน่วยตรวจวัด

สป. ☐ กรมอนามัย ☐ กรมส่งเสริมการเกษตร

☐ กรมการปกครอง

☐ กรมการขนส่งทางบก ☐ กรมการขนส่งทางบก

☐ กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขที่รับ 2974
วันที่ - 7 ก.ค. 2569
เวลา 15-40 น.

พจก. พีพี คอนพลัส

เลขที่ 183/40 หมู่ 22 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ 2569

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ดินสไลด์)

เรียน นายกเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 030/2569

สิ่งที่แนบมา ภาพภาพถ่ายพื้นที่เกิดเหตุ

ตามที่ พจก.พีพี คอนพลัส ได้เข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางลงบ้านแม่สาย หมู่ 7 ห้วยน้ำรินเชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 030/2569 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ 2569 โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ตามสัญญาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 นั้น

ในการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ทับถมพื้นที่ก่อสร้าง อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้และมีได้เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดเหตุการณ์ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้เกิดเหตุดินสไลด์จากแนวเขาลงมาทับถมพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงัก เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายดินและปรับสภาพพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อ

2. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดเหตุดินสไลด์ซ้ำในบริเวณเดิม ทำให้ เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องดำเนินการเคลียร์ดินอีกครั้งเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ พจก.พีพี คอนพลัส ได้พยายามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด


อาศัยอำนาจตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หจก.พีพี คอนพลัส จึงขอแจ้งเหตุความล่าช้าดังกล่าว และขอใช้สิทธิ์ ในการยื่นขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อมกันนี้ได้แนบภาพถ่ายสภาพพื้นที่เกิดเหตุประกอบการพิจารณาพร้อมกับ หนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้เกิดเหตุดินสไลด์จากแนวเขาลงมาทับถมพื้นที่ก่อสร้าง

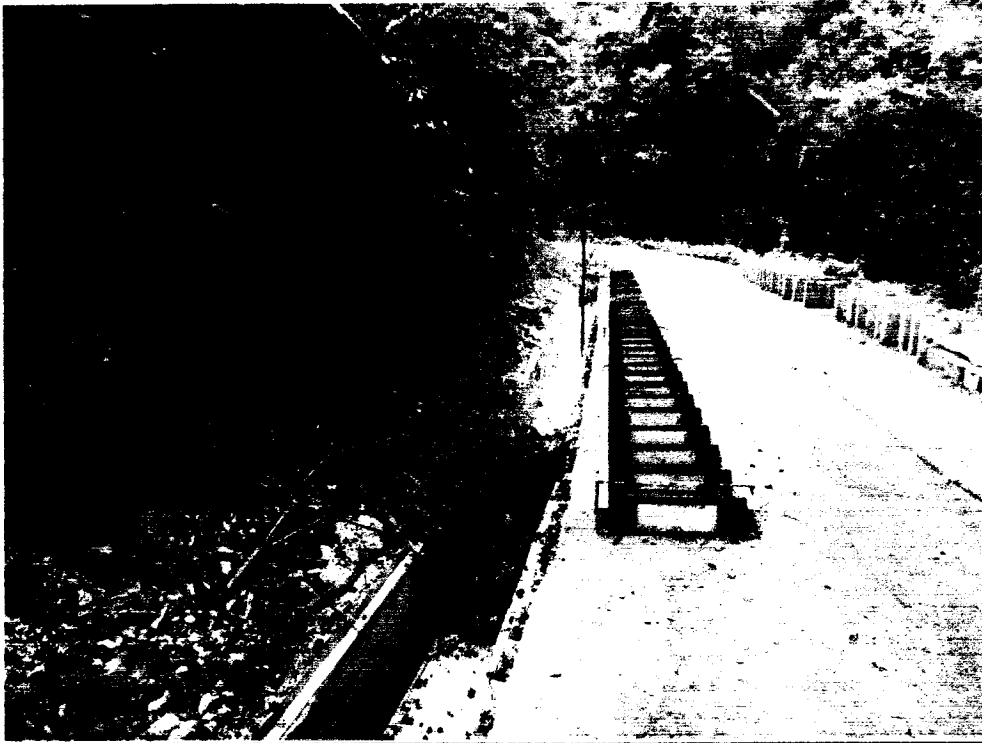

ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ได้เกิดเหตุดินสไลด์จากแนวเขาลงมาทับถมพื้นที่ก่อสร้างซ้ำที่เดิมอีกครั้ง



ภาพถ่ายสภาพพื้นที่งานก่อสร้างได้ดำเนินการเคลียร์ดินปรับสภาพพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569

